



१. अनुगमन भ्रमणको औचित्य: भगेश्वर गाउँपालिका अन्तरगत बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडा भगेश्वर गाउँपालिकाको कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा रहेको यस पालिकाको गौरव (प्राथमिकता प्राप्त) आयोजना रहेको छ। यस गाउँपालिका कार्यालयको मिति २०८०/११/११ को निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको अनुगमन टोली बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडाको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको।

क. गाउँ पालिका उपाध्यक्ष श्री पुष्पा ठकुराठी	संयोजक
ख. अनुगमन अधिकृत श्री प्रेम सिंह घोटा योजना शाखा	सदस्य
घ. सव ईन्जिनियर श्री सुभाष शाही	सदस्य
ङ. सव ईन्जिनियर श्री प्रकाश ऐर साईट प्रमुख	सदस्य
च. स्वास्थ्य संयोजक श्री मान बहादुर शाहु	सदस्य
छ. ना.सु. श्री मातृका प्रसाद भट्ट	

२. भ्रमणको संक्षिप्त उद्देश्य: भगेश्वर गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित दुर्गम स्थानको बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडामा संचालित निर्माण आयोजनाको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरी गाउँपालिकाको बार्षिक कार्यक्रम तथा कार्य प्रगति समेत समावेश गर्न माइलस्टोनसंग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनसंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित विषयका जानकारी सहित, गाउँ पालिका उपाध्यक्ष, योजना प्रमुख, सव ईन्जिनियर, साईट इन्चार्ज र अन्य कर्मचारीहरू समेतको सहभागिता निर्माण कार्यस्थलमै अन्तरक्रिया, प्रश्नोत्तर र अवलोकनको माध्यमबाट आयोजनाको प्रगतिका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिने र योजना कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्याहरू देखिए सोको समाधानका लागि कार्यपालिकाबाट आवश्यक पहल गर्ने रहेको।

३. भ्रमण कार्यतालिका तथा विवरण:

मिति	कार्यक्रम	कैफियत
२०८०/११/१५	बगरकोट — लेकुडा	
२०८०/११/१६	बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण	
२०८०/११/१६	बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडाक्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण अनुगमन टोली, निर्माण व्यवसायी अन्य सरोकारवालाहरूको समेतको सहभागितामा छलफल, अन्तरक्रिया।	
२०८०/११/१६	लेकुडा-बगरकोट	


४. बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडाको स्थलगत अवलोकन र निरीक्षण:

मिति २०८० फाल्गुन १५ गते निरीक्षण टोली स्थलगत अनुगमनको लागि पुगेको थियो। सो अवसरमा टोली प्रमुख सहितका प्राविधिकहरूले बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडाको कार्य प्रगती सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नु भयो। सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको छ छैन कति कार्य भएको जानकारी प्राप्त भयो। त्यस्तै गरी सोही दिन अन्य निर्माण हुने क्षेत्रको समेत स्थलगत निरीक्षण गरियो।

[Handwritten signature and date २०८०/११/१६]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



मिति २०८० फाल्गुन १५ गते बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडा निर्माण व्यवसायी एम वि कन्ट्रक्सनका साईट इन्चार्ज सँग बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडाको स्थलगत निरीक्षण गरी समष्टिगत विकास निर्माण एवं सोको प्रगति सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नु भयो। यस क्षेत्रका गर्भवती आमाहरु बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडामा सुत्केरी हुन सक्ने देखिन्छ निर्माण गतिविधि सञ्चालन भएकोले समयमै सम्पन्न हुने देखिन्छ ।

आ.ब.०८०/०८१ प्रदेश समपूरक कोष २५०००० र गाउँ पालिका रु २५००००० गरी जम्मा कुल बजेट रकम रु ५०००००० मिति २०८०।०५।१७ गते खुला वोलपत्र आह्वान गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट रु ४२११७५८.६८ भ्याट र पि एस सहित एम वि कन्ट्रक्सन अमरगढी डडेल्धुरा को नाममा ठेक्का सदर भई मिति २०७९।७।२४ गते सम्झौता अविध मिति २०८१।१।३० सम्म भएको देखिन्छ । विभिन्न मितिमा एम वि कन्ट्रक्सन अमरगढी डडेल्धुरालाई निर्माण कार्यको लागि यस कार्यालयबाट पत्राचार गरिएको बर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण सम्बन्धित कार्य शुरु भएको स्थिति देखिन्छ।

५. बार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था:

शीर्षक	बजेट (रु.)	हालसम्मको खर्च (रु.)	बाँकि बजेट (रु.)	खर्चको प्रतिशत
बर्थिङ्ग सेन्टर लेकुडा	४२११७५८.६८	३६००००	३८५१७५८.६८	८.५४

६. नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगतिको अवस्था:

मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि	कैफियत
लेकुडा क्षेत्र भित्रका गर्भवती महिलाहरुको लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा अभिवृद्धि	सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको।	

७. आयोजना संचालनमा देखिएका समस्याहरु: माथि उल्लिखित कार्यहरु समयमै निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न आवश्यक हुने व्यहोरा अनुगमन टोलीबाट अवगत भयो।


८. अनुगमन टोलीको मन्तव्य/सुझावहरु:

- निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको निर्धारित समय भित्र कार्य सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
- ड्रइङ्, डिजाइन र इष्टिमेट बमोजिम निर्माण गर्ने ।
- प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री जस्तै बालुवा, गिट्टी, इटा, सिमेन्ट,छड आदी इष्टिमेट बमोजिम र ल्याव टेष्ट सहितको गुणस्तरीय हुनुपर्ने ।
- प्राविधिकको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशन बमोजिम निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ।
- इटा, बालुवा र गिट्टीको गुणस्तर यकिन गर्न नसकिएको ।


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- सम्बन्धित साईट प्राविधिकको निर्देशन पालना नगरेको देखियो ।
- कार्यालयले खटाइएको प्राविधिकले निर्माण अवधिभर निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्ने ।

निर्माण स्थलहरु अवलोकनको क्रममा खिचिएको तस्वीरहरु

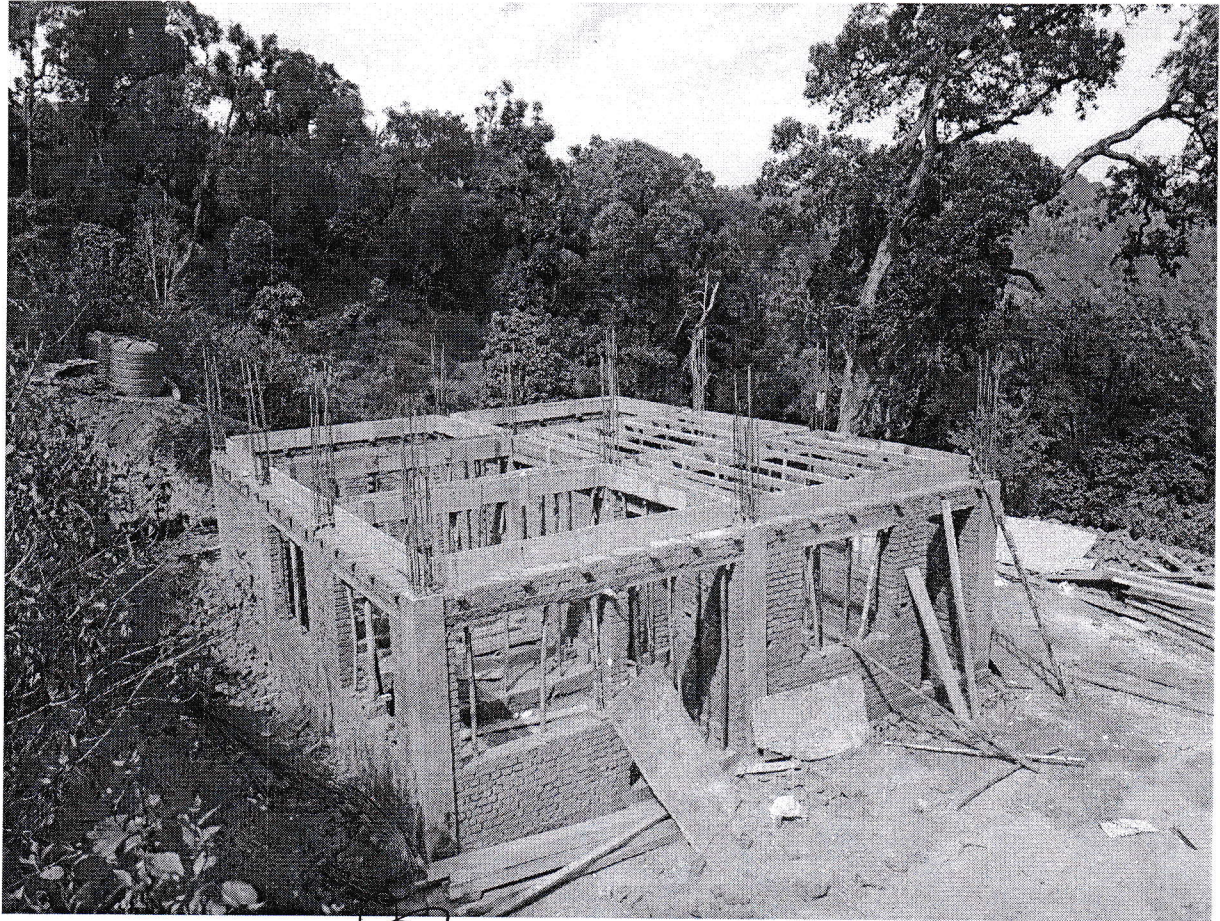

२२
१५/०५/२०७७
५४७

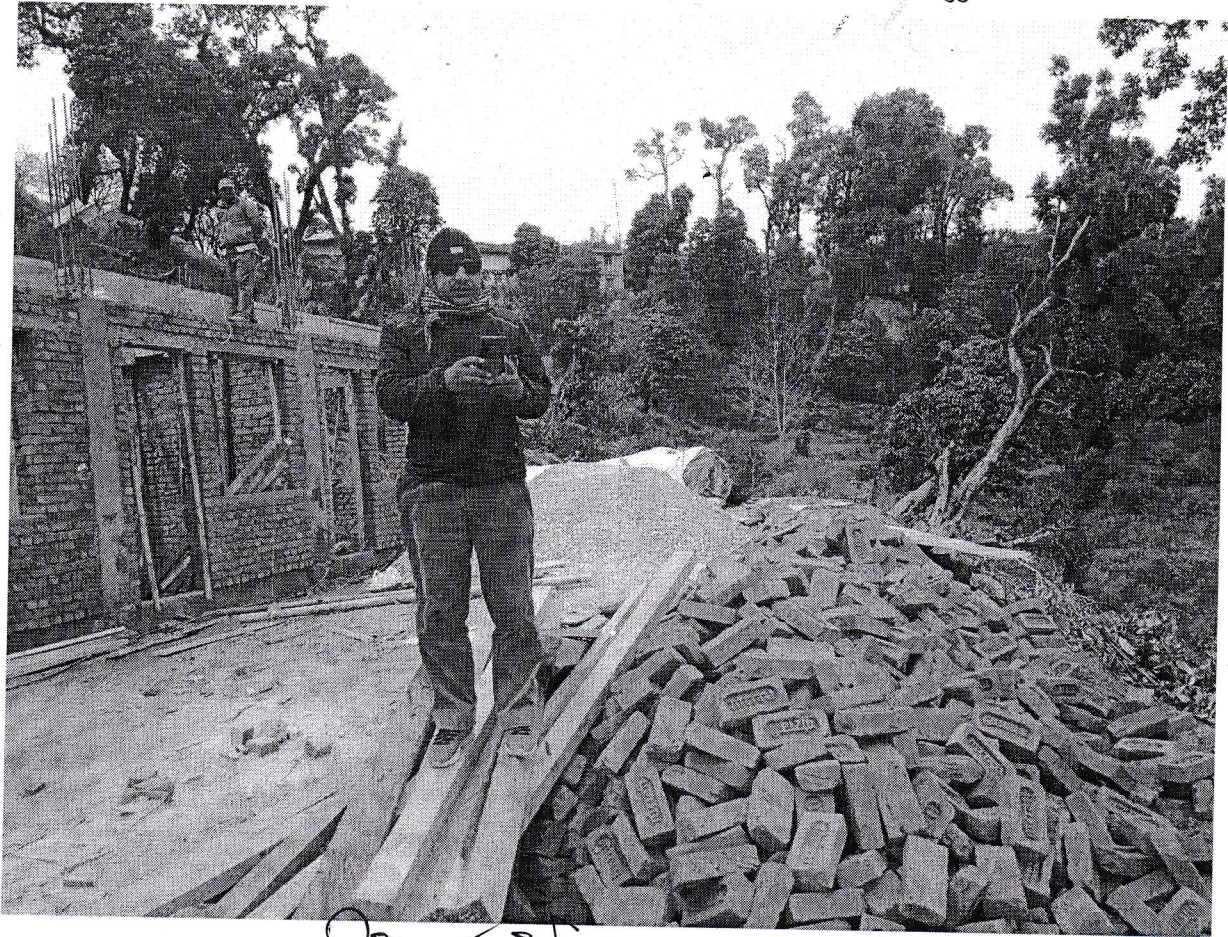

२२
जेश्वर कार्की
२०७३/०१/१६
यह



र
फ
०१/०५/२०७०
५५
